


| 市町村名                                     |                              | 読谷村   |  |                    |              |             |         |      |
|--|------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------|---------|------|
| 平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】  |                              |   |  |                    |              |             |         |      |
| 事業番号・事業名                                 | 1-10 読谷村地域振興センター(仮称)整備事業     |   |  | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(2)ウ   |             |         |      |
|  | 担当部課名                        | 建設経済部跡地利用推進課  | 事業実施(予定)年度   | 平成25~27年度          | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 観光客の受入体制の整備 |         |      |
| 事業内容                                     |                              | 読谷補助飛行場跡地における主な課題である「農業を主体とした6次産業化」、「情報の共有と発信による地域振興」の解決を図るため農漁商工の連携による地域振興と交流拠点づくりのため「読谷村地域振興センター(仮称)」を整備する。   |  |                    |              |             | Ⅲ-1-(1) |      |
|  | 実施方法                         | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( ) |  |                    |              |             |         |      |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                              |   |  | 25年度               | 26年度         | 26年度(繰越)    | 27年度    | 28年度 |
|  | 予算の状況                        | (a) 当初予算額   | 74,319   | 404,168            |              |             |         |      |
|  |                              | (b) 予算現額  | 37,238   | 471,946            |              |             |         |      |
|  |                              | (c) 増減額(b-a)  | ▲ 37,081   | 67,778             | 0            |             |         |      |
|  |                              | (d) 繰越額   | 0  | 0                  | 152,338      |             |         |      |
|  |                              | A. 計(b+d)   | 37,238   | 471,946            | 152,338      |             |         |      |
|  | B. 執行済額                      |   | 37,132   | 319,608            | 152,338      |             |         |      |
|  | うち交付金充当額                     |   | 29,706   | 255,686            | 121,870      |             |         |      |
|  | 次年度繰越額                       |   | 0  | 152,338            |              |             |         |      |
|  | 執行率(%) (B/A)                 |   | 99.7%  | 67.7%              | 100.0%       |             |         |      |
| 予算の状況の説明                                 |                              | 第7号補正で、工事費及び委託料の増額を行った。また、工事施行に必要な用地の確保が難航したため明許繰越となった。   |  |                    |              |             |         |      |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                  |   | 達成状況   |                    |              |             |         |      |
|  | 建築物の実施(延べ床面積:3,355㎡)         | 目標  | (基本実施設計実施)   | (建築物の実施)           | ( )          | ( )         | ( )     |      |
|  |                              | 実績  | 基本実施設計実施   | 建築物の実施             |              |             |         |      |
|  |                              | 目標  | ( )  | ( )                | ( )          | ( )         | ( )     |      |
|  |                              | 実績  |  |                    |              |             |         |      |
|  | 達成状況説明                       |   | 工事は、平成26年度から27年度までの工期で、平成26年度で鉄骨工事や銅製建具工事、浄化槽設備工事、受変電設備工事等が完了した。 |                    |              |             |         |      |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H26成果目標(指標)                  |   | 基準値(年度)  | 25年度               | 26年度(繰越)     | 27年度        | 目標値(年度) |      |
|  | 建築物(地域振興センター)の一部完了(進捗率35.5%) | 目標  | ( )  | (基本実施設計実施)         | (建築物進捗65.5%) | ( )         | ( )     |      |
|  |                              | 実績  |  | 基本実施設計実施           | 建築物進捗65.5%   |             |         |      |
|  |                              | 目標  | ( )  | ( )                | ( )          | ( )         | ( )     |      |
|  |                              | 実績  |  |                    |              |             |         |      |
|  | 進捗状況説明                       |   | 工事は、平成26年度から27年度までの工期。   |                    |              |             |         |      |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)   | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|-------|---|----------------------|
|       | 台風6号、9号、12号、15号と4つの台風の襲来により、その都度台風対策、復旧作業があり、工事に遅れがでたため、繰越となった。 | 外部環境を考慮した工期の設定が必要。   |

**今後の取り組み方針**

H28年5月オープン  
 観光案内所や、FMラジオ・インターネット動画配信を使った観光情報の発信を行い、観光振興に資する。また、キッチンスタジオ等での村産農産物等を使用した商品開発や、村製品の販売等により年間利用者数168,000人を目指す

**資金の流れ**  
 (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

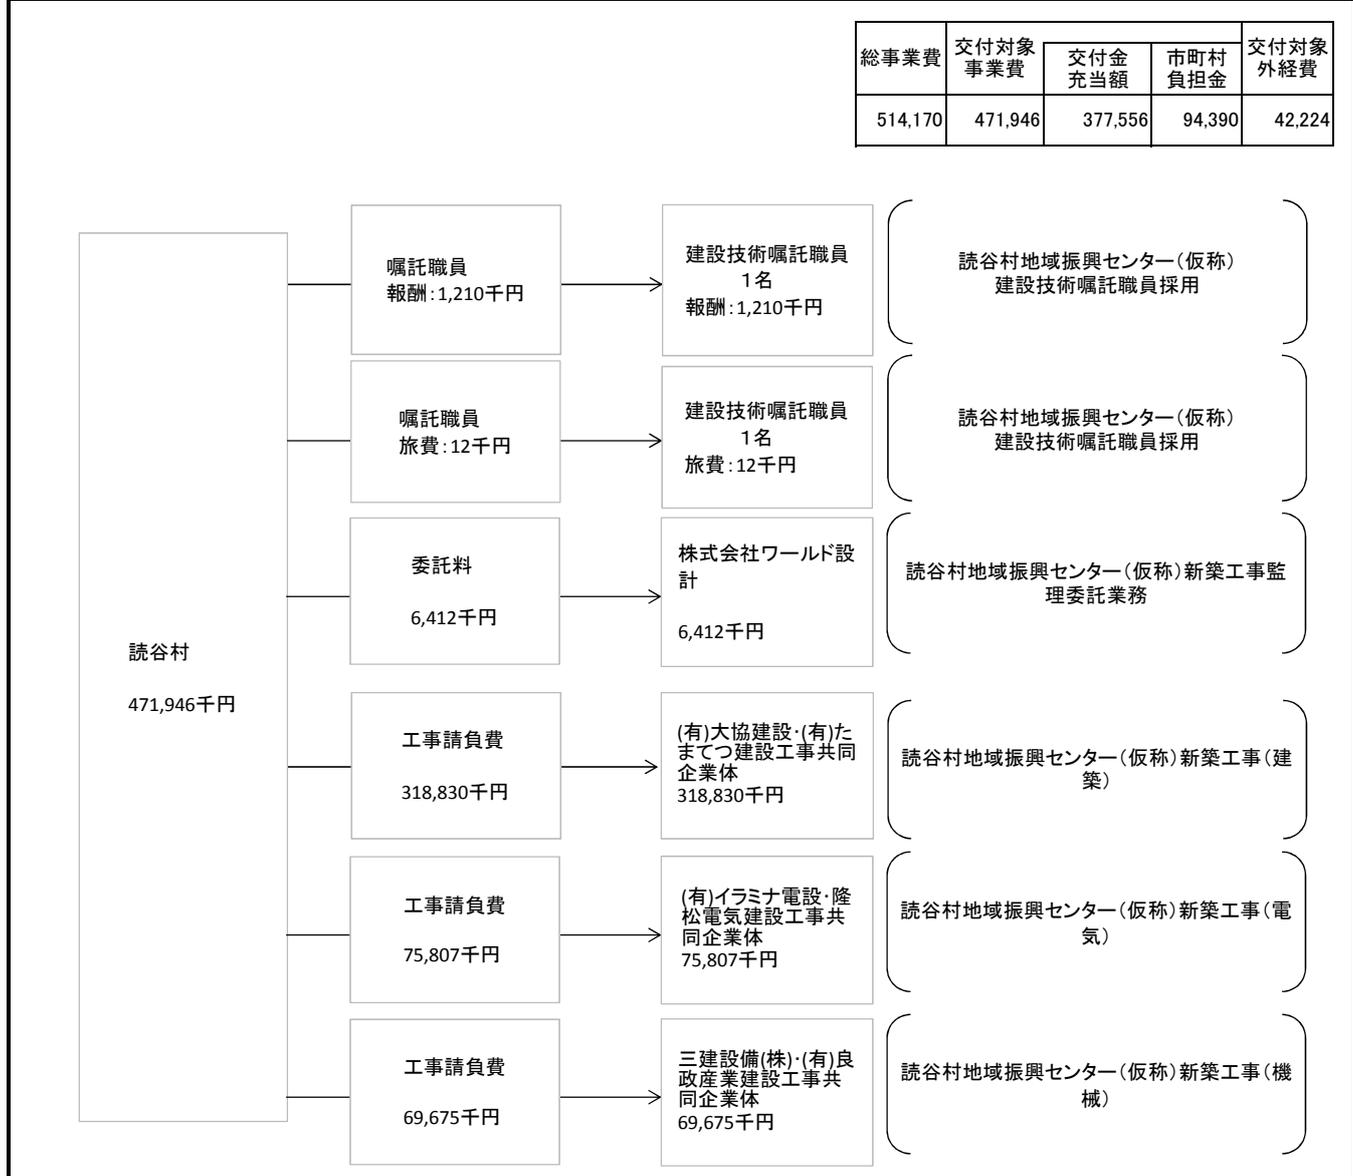

| 資金の<br>用途の<br>流れ、<br>検<br>査<br>評<br>価 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明  |
|---------------------------------------|----|--------------------------------|---|
|                                       | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託及び工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。                    |
|                                       | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ○予算規模については執行率は100.0%であり、適正な規模であったと考えている。                      |
|                                       | -  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ○費目・用途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。 |
|                                       | ○  | 費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |   |

|   |  |   |                  |                  |                    |                                |         |
|---|--|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------|
| 市町村名  | 読谷村  |   |                  |                  |                    |                                |         |
| 平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】         |  |   |                  |                  |                    |                                |         |
| 事業番号・事業名  | 4-②  | 座喜味城跡駐車場整備事業  |                  |                  | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-1-(4)-ア                    |         |
| 担当部課名   | 教育委員会 文化振興課  | 事業実施(予定)年度  | 平成25~26年度        |                  | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり<br>Ⅲ-3-(2) |         |
| 事業内容  | 世界遺産座喜味城跡への来場者への利便性を図るために駐車場を整備する。   |   |                  |                  |                    |                                |         |
| 実施方法  | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |   |                  |                  |                    |                                |         |
| <b>予算額・執行額</b><br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |  | 25年度  | 25年度(繰越)         | 26年度             | 26年度(繰越)           | 27年度                           |         |
|   | 予算の状況  | (a) 当初予算額   | 64,434           | -                | 47,785             |                                |         |
|   |  | (b) 予算現額  | 66,786           | -                | 45,785             |                                |         |
|   |  | (c) 増減額(b-a)  | 2,352            | -                | ▲ 2,000            | 0                              |         |
|   |  | (d) 繰越額   | 62,376           | 62,376           |                    | 29,801                         |         |
|   | A. 計(b+d)  |   | 66,786           | 62,376           | 45,785             | 29,801                         |         |
|   | B. 執行済額  |   | 4,410            | 61,835           | 15,984             | 29,801                         |         |
|   | うち交付金充当額   |   | 3,528            | 49,468           | 12,787             | 23,840                         |         |
|   | 次年度繰越額   |   | 62,376           |                  | 29,801             |                                |         |
|   | 執行率(%) (B/A)   |   | 6.6%             | 99.1%            | 34.9%              | 100%                           |         |
| 予算の状況の説明  |  | 繰越理由:用地購入に係る抵当権抹消に不測の日数がかかり、用地購入がずれ込み、工事着手も遅れることとなった  |                  |                  |                    |                                |         |
| <b>活動目標(指標)及び達成状況</b>                           | H26活動目標(指標)  |   | 達成状況             |                  |                    |                                |         |
|   | 駐車場工事  | 目標  | (普通車30台収容)       | ( )              | ( )                | ( )                            | ( )     |
|   |  | 実績  | 普通車26台<br>軽自動車3台 |                  |                    |                                |         |
|   |  | 目標  | ( )              | ( )              | ( )                | ( )                            | ( )     |
|   |  | 実績  |                  |                  |                    |                                |         |
|   | 達成状況説明   | 収容台数で目標をやや下回ったが、ほぼ計画どおりの29台収容(普通車26台、軽自動車3台)の整備が完了した。 |                  |                  |                    |                                |         |
| <b>成果目標(指標)及び進捗状況</b>                           | H26成果目標(指標)  |   | 基準値(年度)          | 26年度(繰越)         | 27年度               | 28年度                           | 目標値(年度) |
|   | 駐車場(普通車約30台収容)の整備完了  | 目標  | ( )              | (普通車30台収容)       | ( )                | ( )                            | ( )     |
|   |  | 実績  |                  | 普通車26台<br>軽自動車3台 |                    |                                |         |
|   |  | 目標  | ( )              | ( )              | ( )                | ( )                            | ( )     |
|   |  | 実績  |                  |                  |                    |                                |         |
|   | 進捗状況説明   | 駐車場整備が実施されたことにより、特にレンタカーでの世界遺産座喜味城跡への来場者の利便性が向上した。    |                  |                  |                    |                                |         |


| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                           | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)   |
|-------|---|--|
|       | 工事実施にあたっては工事現場周辺住民や座喜味城跡を訪れる観光客への影響を少なくすることに留意する。 | 工事中は周辺住民へ工事内容をお知らせし理解が得られるように周知する。また、資材搬入時には現場において観光客や通行車両に対し誘導員を配置し安全に配慮する。 |

**今後の取り組み方針**

世界遺産座喜味城跡にこれまで以上の観光客に来ていただき、沖縄や読谷村の歴史と文化を体感していただくようにする。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費   | 交付対象事業費 | 交付金    |        | 交付対象外経費 |
|--------|---------|--------|--------|---------|
|        |         | 充当額    | 市町村負担金 |         |
| 45,785 | 45,785  | 36,627 | 9,158  | 0       |

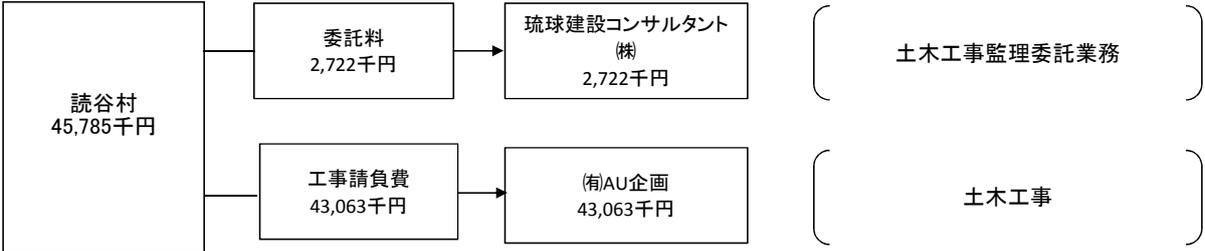

| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>費目<br>・<br>評価 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明  |
|------------------------------------|----|--------------------------------|---|
|                                    | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | 受託業者は指名競争入札を行い、最低落札提示業者へ発注したので妥当だと考える。また、費用・使途については、事業の目的に鑑み必要な経費のみに支出を行うとともに、額の確定時において支出等に関する書類により確認、適正であった。 |
|                                    | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |   |
|                                    | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |   |
|                                    | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |   |
