

# 公立沖縄北部医療センター 実施設計の進捗について

---

令和6年7月4日協議会

公立沖縄北部医療センター整備協議会事務局

(沖縄県北部医療組合)

# 1 履行期間変更理由

当初履行期間：令和5年10月31日～令和6年11月30日

変更履行期間：令和5年10月31日～令和7年3月31日

## 【履行期間変更理由等】

### • 杭の検討

地盤調査の結果、支持地盤の深さが50m程度であることが判明し、適切な杭の選定に時間を要した。

### • 配置計画の決定

配置計画については、両病院の各部門別のヒアリングを経て決定するが、その調整に時間を要した。

### • 設備機器の選定

エネルギーサービス事業を導入しているが、最適な機器の選定及び配置計画の決定に時間を要した。

### • 各種申請


免震構造について、大臣認定の取得を予定しているが、上記理由により大臣認定に必要な構造計算が遅れたため、申請に係る期間が3ヶ月程延びる予定。

更に建築基準法に基づく計画通知（建築確認）は大臣認定後の申請となるため、全ての手続きが完了するのは令和7年3月頃となる予定となり、成果品の取りまとめも含めると履行期間は令和7年3月末まで延長する必要がある。

### • 全体工程への影響

令和7年度前半に工事発注・着手の予定は変わらないため、設計業務の履行期間延長による全体工程への影響はない。（※ 県農林水産部が実施している土壌汚染調査の進捗状況については引き続き注視していく必要がある）

# 2 実施設計業務工程表

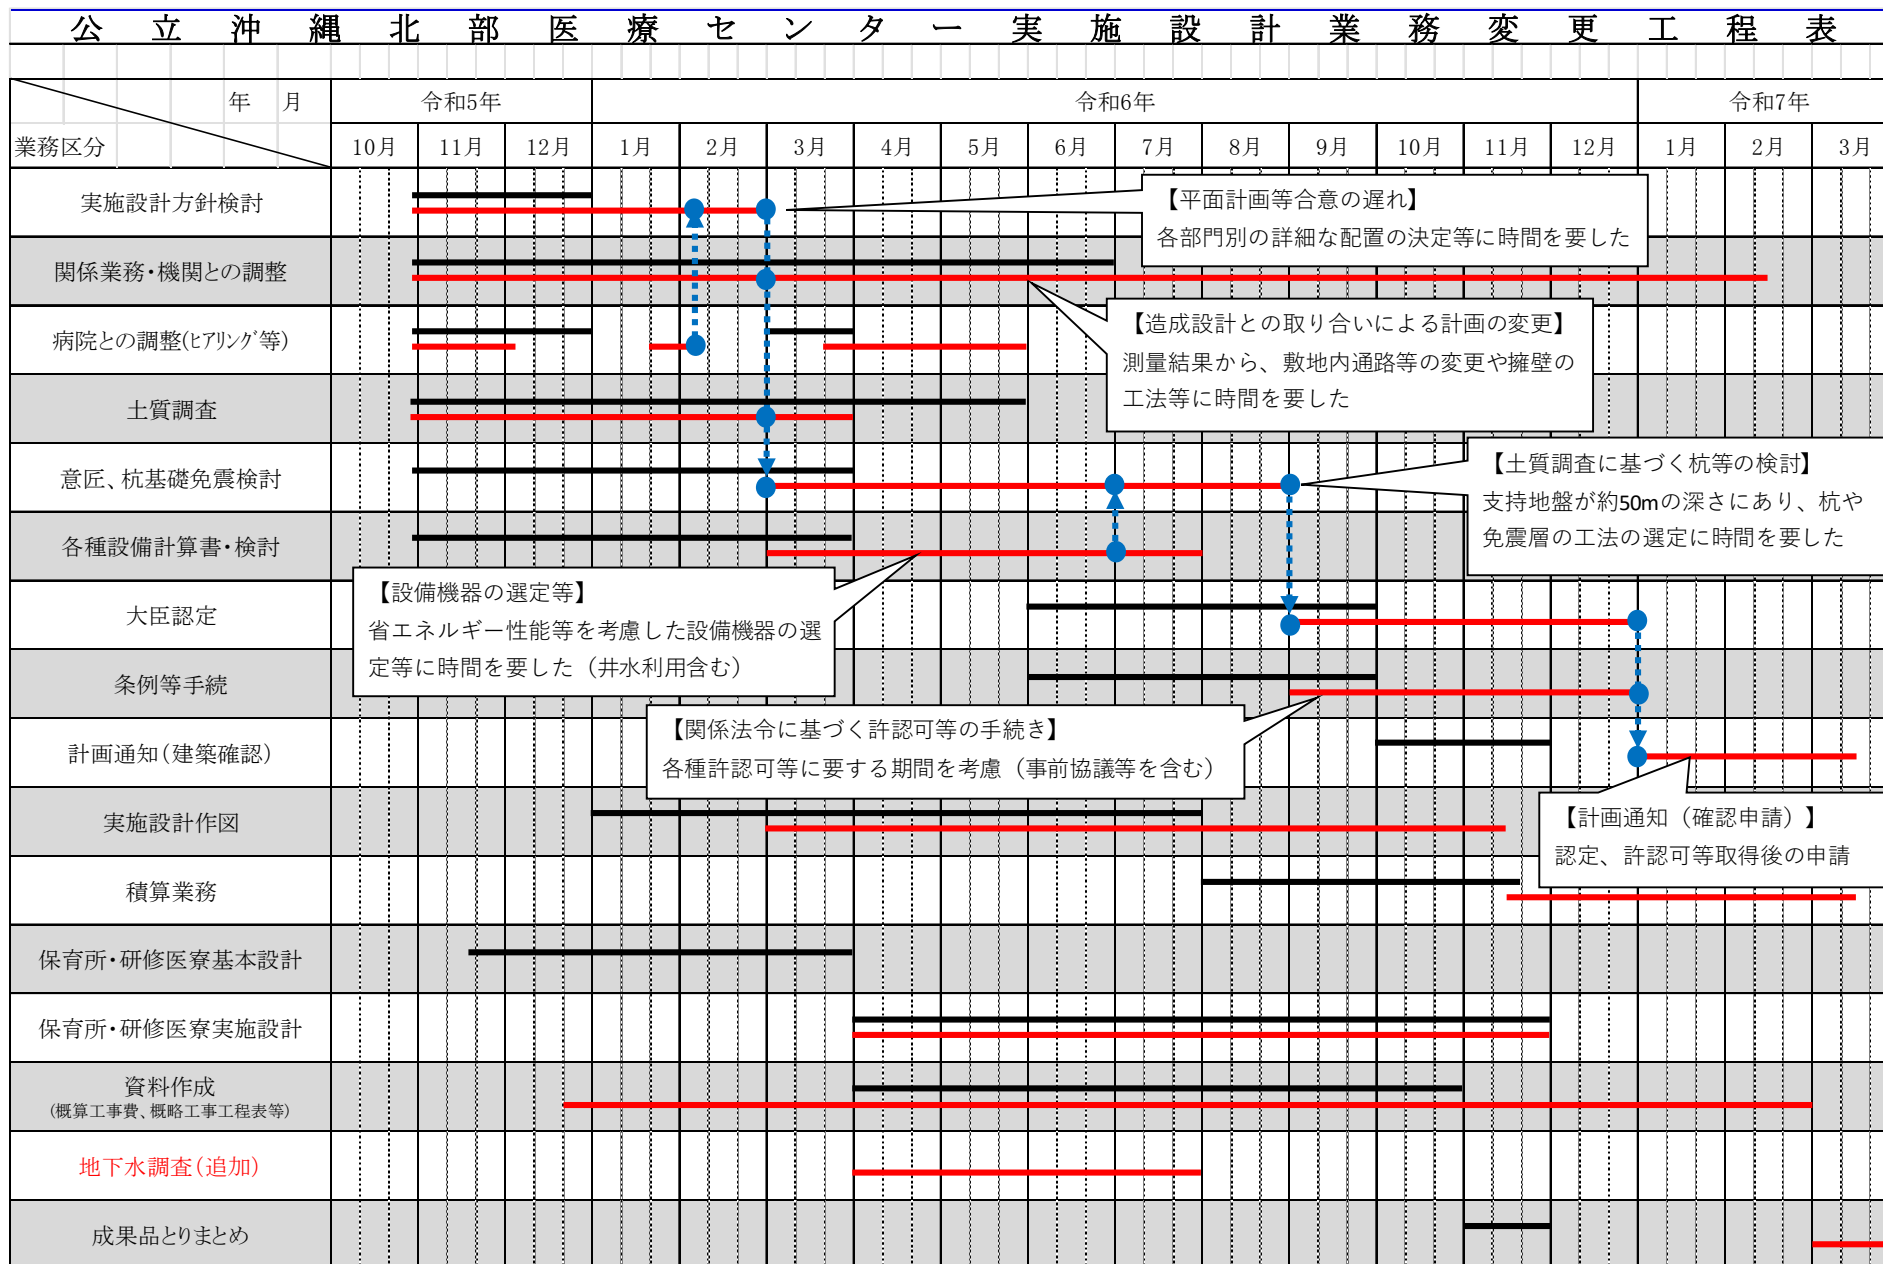

※当初履行期間：黒色線

変更履行期間：赤色線
