

市町村名	北谷町						
令和元年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-④	アラハビーチ周辺魅力向上事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-(ア)		
担当部署名	建設経済部土木課	事業実施(予定)年度	令和元年度	沖縄振興基本方針該当箇所	観光客受入体制の整備		
事業内容	・本町の主要な観光地の一つである安良波公園の機能強化を目的とし、本公園の主要施設であるインディアンオーク号改良及び周辺整備工事を行い、観光施設としての魅力度向上を図る。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和3年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		H30年度	R1年度	R1年度(繰越)	R2年度	R3年度	
	予算の状況	(a)当初予算額		200,000	-		
		(b)予算現額		200,000	-		
		(c)増減額(b-a)		0	-		
		(d)繰越額		200,000	200,000		
	A. 計(b+d)			200,000	200,000		
	B. 執行済額			0	189,761		
	うち交付金充当額			0	151,808		
	次年度繰越額			200,000	-		
	執行率(%) (B/A)			0.0%	94.9%		
予算の状況の説明		・R1年度に改良工事、周辺整備工事の実施を予定していたが、オリジナル製作品であるため資材の単価調査に不測の日数を要し、繰越しを行った。入札を行った結果、184,492千円で契約し、工事履行中に変更契約を行い、最終的に執行額が189,761千円となっている。					
活動目標(指標)及び達成状況	R1活動目標(指標)		達成状況				
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
	インディアンオーク号改良及び周辺整備工事の施工	目標	()	()	改良工事、周辺整備工事の完了	()	()
		実績			改良工事、周辺整備工事の完了		
		目標	()	()	()	()	
		実績					
達成状況説明	・R1年度に実施設計及び単価調査を完了し、R2年度に改良工事、周辺整備工事を完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R1成果目標(指標)		基準値(年度)	H30年度	R1年度	R2年度	目標値(令和3年度)
	インディアンオーク号改良及び周辺整備工事の施工完了	目標	()	()	(完了)	()	()
		実績			完了		
	【参考指標】 安良波公園利用者数	目標	()	()	()	()	(500,000人)
		実績		412,832人	345,889人	205,727人	
	進捗状況説明	・R2年1月末で整備が完了し、令和3年3月から供用が開始されている。					


	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
取組の検証	<ul style="list-style-type: none"> ・インディアンオーク号は本町の観光名所の一つである安良波公園の主要施設の一つであるが、老朽化や遊具機能不足により観光施設としての魅力度低下に繋がっていた。 ・インディアンオーク号周辺においても、休憩施設が不足しており観光客の利便性が低い状況であった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・インディアンオーク号及び周辺整備の工事が完了することで、目標達成している。 ・今後、安良波公園利用者数500,000人/年に向けて、国内外への情報発信を関係各課と調整し取り組んでいく。

今後の取り組み方針

・関係各課と連携し、施設の整備完了の情報を、観光プロモーション関連事業において観光PR動画等で当該施設の紹介を行うなど、継続的にPR活動を行う。
 ・本事業の効果を確認するため、安良波公園利用者数を計測する。

資金の流れ
 (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金		交付対象外経費
		充当額	市町村負担金	
#####	189,761	151,808	37,953	0

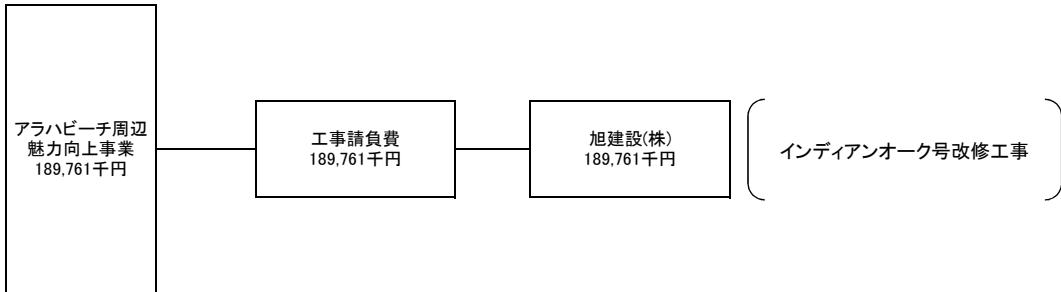

資金の流 使途の点 検評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○請負業者は町の指名業者選定委員会にて企業組織、実績、知識等を勘案した上で選定されており、妥当であったと考えている。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算規模は、事業内容に見合った適正な規模で確保されており、妥当であった。
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目・使徒については事業目的達成の観点から必要なものなのか等について額の確定時において支出等に関する書類により確認し、適正であった。
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
