

市町村名		粟国村					
平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-	粟国島パークゴルフ場機能拡充事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ウ	
担当部署名	総務課	事業実施(予定)年度	平成24年度	沖縄振興基本方針該当箇所	観光客の受入体制の整備		
事業内容	粟国村の新たな観光資源として平成24年5月に開業した粟国島パークゴルフ場利用者の利便性を向上させるため、シャワー施設や貯水タンク、散水栓等を整備する。						
実施方法	直接実施 委託 補助 負担 その他 ()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)			24年度	24年度(繰越)	25年度	26年度	27年度
	予算の状況	(a)当初予算額	50,925	0			
		(b)予算現額	52,975	0			
		(c)増減額(b-a)	2,050	0			
		(d)繰越額	-	46,331			
		A.計(b+d)	52,975	46,331			
	B.執行済額		7,331	44,648			
	うち交付金充当額		5,864	33,415			
	次年度繰越額		46,331	-			
	執行率(%) (B/A)		13.8%	96.4%			
予算の状況の説明		当初、平成24年度内で工事完了の予定であったが、工事請負の入札で3回の不調が続いたため明許繰越となった。(平成25年9月完成) ・不用額1,683千円は、工事請負費の入札残によるものであり、当初計画どおり事業を実施できた。					
活動目標(指標)及び達成状況	H24活動目標(指標)		達成状況				
			24年度	25年度	26年度	27年度	
	シャワー室兼更衣室1棟及び散水栓4箇所の整備	目標	(設計・監理・工事の実施)	()	()	()	
		実績	設計・監理・工事の完了				
		目標	()	()	()	()	
		実績					
達成状況説明	・粟国村の新たな観光資源として平成24年5月に開業した粟国島パークゴルフ場の利便性向上を図るため、シャワー施設及び脱衣所(ロッカー室)を整備した。また、芝生の安定管理を図るため、倉庫や雨水タンク、散水栓等を整備した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	H24成果目標(指標)		基準値(年度)	24年度	25年度	26年度	目標値(年度)
	シャワー室兼更衣室1棟及び散水栓4箇所の整備	目標	()	(設計・監理・工事の実施)	()	()	()
		実績		設計・監理・工事の完了			
	[参考指標]		目標	()	()	()	()
			実績				
	進捗状況説明	・粟国島パークゴルフ場内にシャワー施設や脱衣所(ロッカー室)が新設された事により、観光客の利便性が向上した。 ・倉庫や雨水タンク、散水栓等を整備した事により、芝生の安定管理が図れるようになった。					


取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	<ul style="list-style-type: none"> 平成24年度内に完成する予定だったが、増税前の駆け込み需要等の影響もあり、入札不調が3回続いた事で事業の遅れが生じ、繰り越し事業となった。 栗国島パークゴルフ場の県内外への周知広報不足が課題である。 	<ul style="list-style-type: none"> 今回整備したシャワー施設及び脱衣所を適切に管理するとともに、散水設備を活用し芝生の維持管理に努める。また、日本パークゴルフ協会に加盟し、認定コースを取得することで観光客及び大会の誘致を図る。

今後の取り組み方針

栗国島パークゴルフ場を村の観光資源として活用し、新たな観光客を獲得するために、日本パークゴルフ協会に加盟し、認定コースを取得することにより、さらに(県内外の)大会誘致活動や広報活動などに取り組む。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額		交付対象外経費
		市町村負担金		
51,979	51,979	39,280	12,699	0

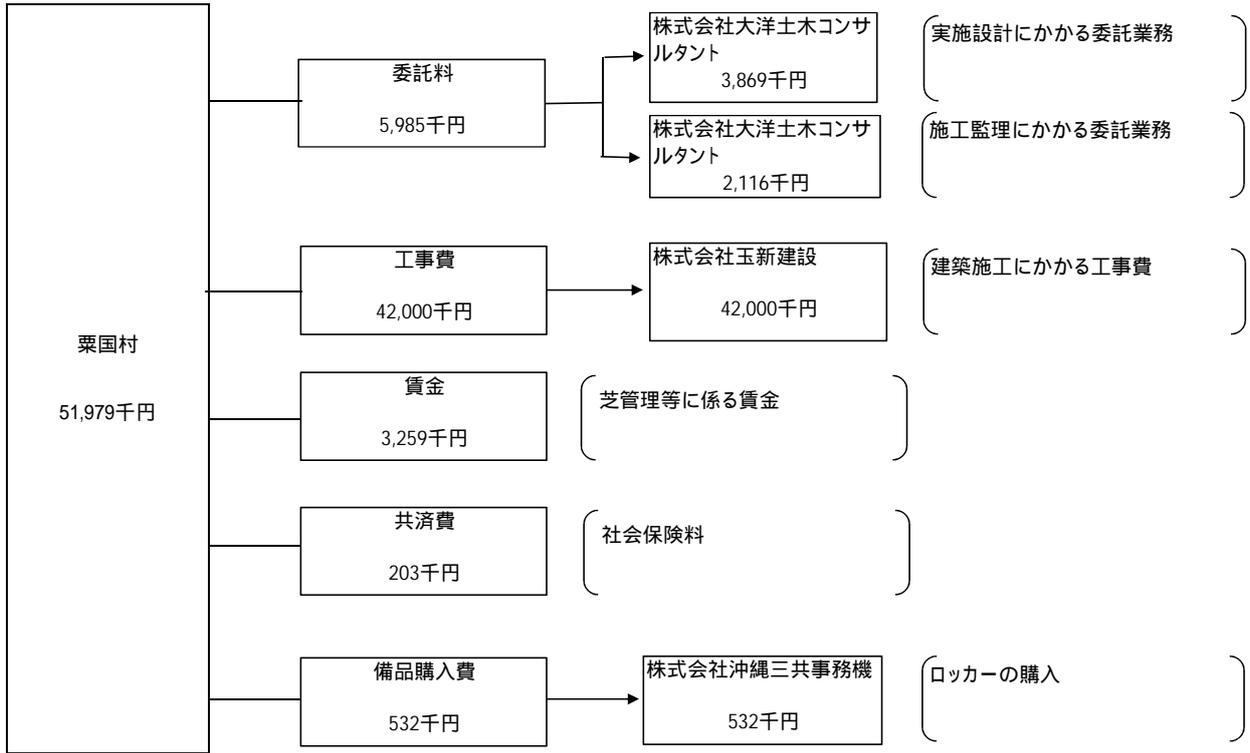

資金の流 れ、 点 検 評 価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明	
			支出先の選定方法は妥当か。	指名競争入札により、企業組織、実績、知識等を勘案し、委託業者を選定しており、妥当であったと考えている。 費目・用途については事業目的達成の観点から必要なものなのか等について額の確定時において支出等に関する書類により確認、適正であった。
			予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-		受益者との負担関係は妥当であるか。	
		費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。		

市町村名	粟国村
------	-----

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号・事業名	1-	マナナ崎整備事業	沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ウ
担当部課名	経済課	事業実施(予定)年度	平成24~25年度	観光客受入体制の整備
			沖縄振興基本方針該当箇所	-1-(1)

事業内容	観光客や住民の憩いの場である島1番の景勝地マナナ崎の快適性及び安全性の向上を目的に東屋及び安全柵を整備する。			
------	--	--	--	--

実施方法	直接実施	委託	補助	負担	その他()
------	------	----	----	----	--------

		24年度	24年度(繰越)	25年度	26年度	27年度
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況					
	(a)当初予算額	65,482	0			
	(b)予算現額	62,895	0			
	(c)増減額(b-a)	2,587	0			
	(d)繰越額	-	39,459			
	A.計(b+d)	62,895	39,459			
	B.執行済額	23,436	39,459			
	うち交付金充当額	18,748	31,567			
	次年度繰越額	39,459	0			
	執行率(%) (B/A)	37.3%	100.0%			
予算の状況の説明	不要額 2,587千円は入札残によるものであり、事業予算は適切に執行された。東屋のデザイン検討に時間を要したことから、工事が次年度に繰り越した。					

活動目標(指標)及び達成状況	H24活動目標(指標)	達成状況			
		24年度	25年度	26年度	27年度
		東屋1棟及び安全防止柵約350mの整備	目標 (東屋1棟及び安全防止柵約350mの整備)	()	()
	実績 (東屋1棟及び安全防止柵約350mの整備)	()	()	()	
	目標	()	()	()	
	実績	()	()	()	
達成状況説明	平成24年度で安全防止柵約350m及び東屋の設計を行ったが、東屋のデザインの検討に時間を要したことから、工事が次年度へ繰り越した。				


成果目標(指標)及び進捗状況	H24成果目標(指標)	基準値(年度)	24年度	25年度	26年度	目標値(年度)
		東屋1棟及び安全防止柵約350mの整備	目標 ()	(東屋1棟及び安全防止柵約350mの整備)	()	()
		実績	()	(東屋1棟及び安全防止柵約350mの整備)	()	()
	[参考指標]	目標	()	()	()	()
		実績	()	()	()	()
進捗状況説明	観光地であるマナナ崎において安全防止柵及び東屋(村無形文化財の「むんじゅる節」の島娘が被る笠をイメージ)が整備された。今後は、観光スポットとしての認知度をさらに向上させるため、広報活動を実施したい。					

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	平成24年度で安全防止柵約350m及び東屋の設計を行ったが、東屋のデザインの検討に時間を要したことから、工事が次年度へ繰り越した。	今回、整備した安全防止柵及び東屋を適正に管理する。

粟国村の観光スポットとして、より多くの観光客が島一番の景勝地マハナ崎を訪れてくれるように広報活動を推進する。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額		交付対象外経費
		市町村負担金		
62,895	62,895	50,316	12,579	0

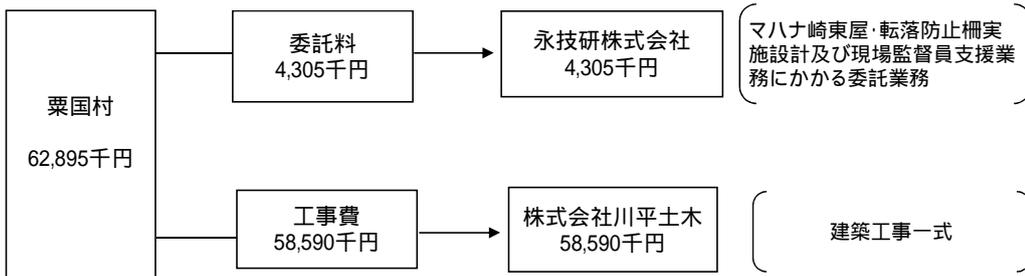

資金の 使途の 流れ、 費目、 点検 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	指名競争入札により、企業組織、実績、知識等を勘案し、委託業者を選定しており、妥当であった。(4回目で落札) 費目・使途については事業目的達成の観点から必要なものなのか等について額の確定時において支出等に関する書類により確認、適正であった。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。		
