
市町村名		竹富町												
平成25年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】														
事業番号 ・事業名	5 - 含みつ糖			製糖施設近代化事業			沖縄	沖縄21世紀ピジョン		第3章 - 3 - (12) - イ				
于未口			## ***	**********		基本	基本計画該当箇所			農林水産業の振興				
担当部課名	農林水産課		全課	事業実施 (予定)年度 平成25年度		沖縄	沖縄振興基本方針 該当箇所		- 1 - (6)					
事業内容	製糖事業者の経営体質強化援し、製糖事業者の安定操		強化のため、製糖事 E操業を確保すること	化のため、製糖事業者が取り組む製造コストの低減、品質管理向上及び 操業を確保することにより、地域の基幹産業「さとうきび・糖業」振興を図る。				上及び徫 を図る。	生管理の	徹底等のた	め製	糖施設整储	帯を支	
実施方法]	直接実施		補助		負担	その)		T			
	(2) 坐如圣管苑		25年度	500	26	年度		27年度		28年	度		29年度	
	予 (,		,580 ,997		-								
	算 🖺	c) 増減額(b-a)		,417										
予算額・	`	d)繰越額	-	,		58,633								
執行額		A.計(b+d)	77	,997		58,633								
(「交付金」+	В	. 執行済額	19	,364		57,529								
「市町村負担」	うち交付金充当額		15,491			46,023								
	次年度繰越額		58,633			-								
	執行率(%)(B/A)			4.8%		98.1%								
	予算の状況の説明 ・製糖工場建屋建設工事の資材(鉄骨)が社会情勢により調達・加工等に時間を要したことにより機械器具設置工事も通れ完成が2月下旬となり双方の工事と調整しながらの工事となったため付帯工事の完成が遅れた。								纬遅					
	H25活動目標(指標)				達成状況									
					25年度			26年月	26年度		27年度		28年度	
	西表製糖施設の周辺外構工事			目材	# (整備実施)	()	()	()
活動目標				実績	į	整備実施完	了							
(指標) 及び達成状況				目材	# ()	()	()	()
				実績	į									
	達成													
	H25成果目標(指標)					基準値 (年度) 25年		25年度	26	26年度 2		7年度 目標値 (年度)		
	西表製糖施設の周辺外溝工事 (アスファルト舗装・排水施設整備)			目材	# ()	(整	· 備実施)	()	()	()
				実績	į	/	整体	講実施完了						
成果目標 (指標) 及び進捗状況				目材	# ()	()	()	()	()
Z Z Z JVIVI				実績	į	/								
	進捗状況説明	・製糖事業者の 事)を支援した	D取り組む製造コス 。	いの低流	或、品質	質向上及び徫	i生管理	里の徹底等	のための	の施設整	備等(造成	工事	付帯施記	

	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)				
取組の検証	・製糖施設整備等の支援により、製糖事業者の取り組む製造コストの低減、 品質向上及び衛生管理、施設管理が徹底されるよう毎年製糖終了後に調査 確認する必要がある。	・製糖事業者の取り組む製造コストの低減、品質向上及び衛生管理、施設管理に改善する必要がある場合は検証し改善をおこなう。				
今後の取り組み方針						

・指定管理者から毎年製糖終了後に報告書を提出してもらい、適切に施設の管理運営がされているか確認を行う。

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象 事業費	交付金 充当額	市町村負担金	交付対象 外経費		
76,892	76,892	61,514	15,378	0		

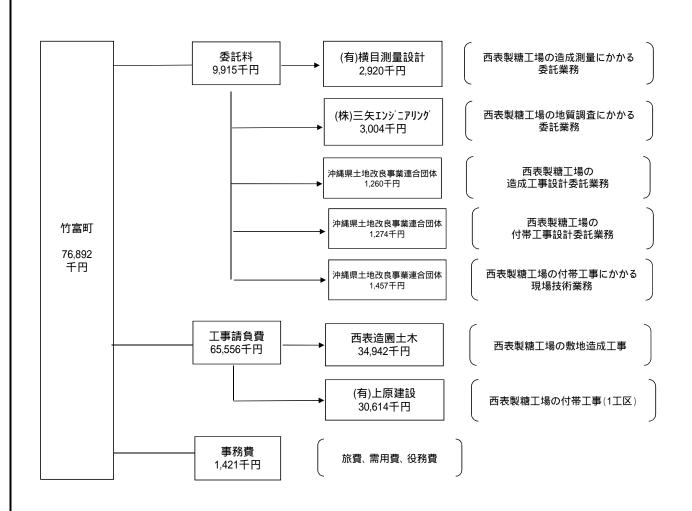

資	評価	点 検 項 目	評価に関する説明			
使金の流の流		支出先の選定方法は妥当か。	・工事事業者等については指名競争入札により企業組織、 実績、知識等を勘案し規則に沿って選定しており、妥当で			
点れ			スカス			
検評費価目	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	・費目、使途については事業目的達成の観点から必要経費であるのか額の確定時において支出等に関する書類により			
in		l	ためるのが領の確定時にあれて文山寺に関する音類により 検査し、適正であった。			
