

市町村名	宜野湾市
------	------

令和4年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号・事業名	1-④	宜野湾海浜公園施設等再編整備事業	新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第6章-3-(2)-(イ)
担当部署名	建設部 施設管理課	事業実施(予定)年度	平成30年度～令和10年度	沖縄振興基本方針該当箇所
				圏域の特色を生かした産業の振興
				Ⅲ-1-(1)

事業内容	海浜という立地を活かした公園としての魅力の向上及び誘客の促進を図るため、文化スポーツ施設を中心に宜野湾海浜公園及びその周辺施設の整備を実施した。
------	--

効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和11年度)
--------	--

実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()
------	---


予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	R2年度	R2年度(繰越)	R3年度	R4年度	R4年度(繰越)
		(a) 当初予算額	194,777		173,839	126,071
	(b) 予算現額	194,777		173,839	126,071	
	(c) 増減額(b-a)	0	0	0	0	0
	(d) 繰越額		45,795	0	0	20,394
	A. 計(b+d)	194,777	45,795	173,839	126,071	20,394
	B. 執行済額	148,982	44,932	165,136	105,677	20,394
	うち交付金充当額	119,186	35,945	118,876	84,541	16,315
	次年度繰越額	45,795	0	0	20,394	0
	執行率(%) (B/A)	76.5%	98.1%	95.0%	83.8%	100.0%
	予算の状況の説明	宜野湾海浜公園施設等再編整備において、再編整備工事(2期)(土木)及び同電気設備工事(2期)について、計画的な予算執行に努め、事業を遂行した。市立グラウンドについて、測量業務及び実施設計業務を完成させて繰越明許費を予定通り執行した。				

活動目標(指標)及び達成状況	R4活動目標(指標)	達成状況			
		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
	再編整備工事(駐車場・照明灯整備)及び市立グラウンド機能拡張実施設計の実施	目標 (実施設計完了)	第1期工事・サブグラウンド整備・投球練習場整備・倉庫設計	倉庫・投球練習場整備	再編整備工事(駐車場・照明灯整備)市立グラウンド機能拡張実施設計の実施
		実績 (実施設計実施)	第1期工事及びサブグラウンド整備実施	倉庫・投球練習場整備実施	再編整備工事(駐車場・照明灯整備)市立グラウンド機能拡張実施設計の実施完了
	達成状況説明	令和4年度は、再編整備工事(駐車場・照明灯整備)及び市立グラウンド機能拡張実施設計を実施した。			

成果目標(指標)及び進捗状況	R4成果目標(指標)	基準値(年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値(R11年度)
			再編整備工事(駐車場・照明灯整備)及び市立グラウンド機能拡張実施設計の完了	目標 () ()	第1期工事・サブグラウンド整備・投球練習場整備・倉庫設計完了	投球練習場整備・倉庫設計完了
			第1期工事及びサブグラウンド整備完了	完了	再編整備工事(駐車場・照明灯整備)完了	
	【参考指標】	目標 () ()	() ()	() ()	() ()	(655,000人)
	施設利用者数	実績				

進捗状況説明	令和4年度は、再編整備工事(駐車場・照明灯整備)を実施し、H30当初350台だった駐車施設について区画幅を広く確保した上で約380台分を整備することにより、公園利用者の利便性向上を図った。市立グラウンドについては、追加の測量業務が必要となり年度内完成が困難となった為、R5年度へ繰越し実施設計が完了した。
--------	--

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	<ul style="list-style-type: none"> ・宜野湾海浜公園施設再編整備工事においては、公園利用者への利用制限を考慮し、公園内のイベントが多い8月に工事一次中止を指示し、9月中旬から工事再開とすることで、公園施設利用者の安全安心に配慮しながら工事を完成させることができた。 ・駐車場整備完成後は、H30年当初350台であった駐車場について区画幅を広げ利便性向上を図った上で約380台の駐車施設を開放することができた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園内で開催されるイベント日程について、主催者等と連携し工事着工時期を見極めて公園施設利用者の利便性向上に留意すると共に工事期間中の安全性の確保を最優先とする。
今後の取り組み方針		
<ul style="list-style-type: none"> ・宜野湾海浜公園再編計画に基づいて整備工事を行い、駐車場再編・ロータリー整備を実施する。 		

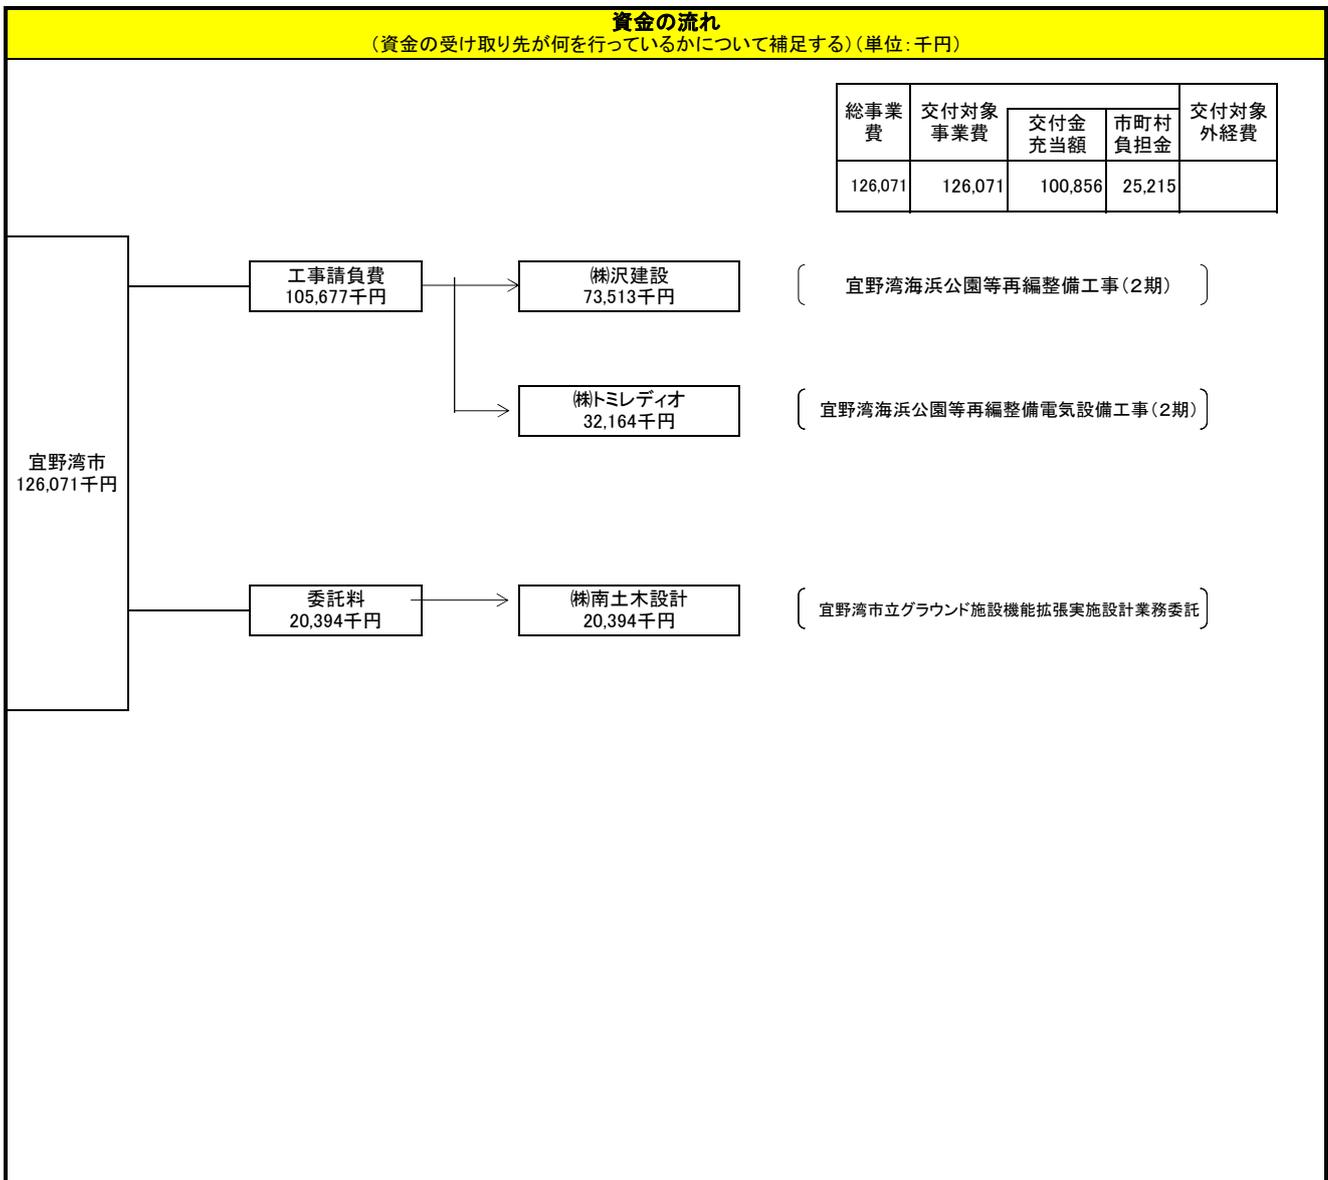

資金の流 れ、費 目・	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託事業者は指名競争入札で選定しており、妥当であったと考えている。 ○予算は実績と見積から積算し、適正な規模と認識している。 ○費目・用途については、精算段階で検査・検収を実施しており、事業目的に即して適正であった。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名 宜野湾市

令和4年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

Table with 4 columns: 事業番号・事業名 (1-6, プロ野球キャンプ野球場施設整備事業), 担当部課名 (建設部 施設管理課), 事業実施(予定)年度 (平成27~令和4年度), 新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 (第4章-3-(2)-(ウ) 多彩かつ質の高い観光の推進), 沖縄振興基本方針該当箇所 (III-1-(1))

事業内容 プロ野球キャンプの実施及びスポーツ合宿の実施増加を図ることを目的に野球場散水設備機能拡張工事を実施した。

効果発現年度 ■当年度 □後年度(年度)

実施方法 ■直接実施 □委託 □補助 □負担 □その他()

Table with 7 columns: 年度 (R1, R2, R3, R4, R4繰越) and rows for 予算額・執行額 (予算の状況: (a)当初予算額, (b)予算現額, (c)増減額, (d)繰越額, A.計, B.執行済額, うち交付金充当額, 次年度繰越額, 執行率(%)(B/A), 予算の状況の説明)


Table with 5 columns: 達成状況 (R1, R2, R3, R4) and rows for 活動目標(指標)及び達成状況 (野球場散水設備機能拡張設計及び工事の実施), 達成状況説明

Table with 7 columns: 基準値(年度), R2, R3, R4, 目標値(R5年度) and rows for 成果目標(指標)及び進捗状況 (野球場散水設備機能拡張設計及び工事の完了, 【R5成果目標】①プロ野球キャンプ実施件数, ②スポーツ合宿誘致件数), 進捗状況説明

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	<p>・他球団の県内キャンプ野球場が改築される中で、宜野湾市立野球場においてもプロ水準の施設を目指し、キャンプ誘致を継続して実施できている。</p>	<p>・市立野球場のほか、周辺のキャンプ関連施設についても整備し、野球場だけでなく周辺施設も含めたキャンプ地全体をアピールし、県内外からの集客を図る必要がある。</p>
今後の取り組み方針		
<p>・新たな施設整備について広報等により市民へ周知し観光客や公園利用者の利用増及び利便性向上を図る。</p>		

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付先		交付対象外経費
		交付金充当額	市町村負担金	
9,750	9,750	7,800	1,950	0

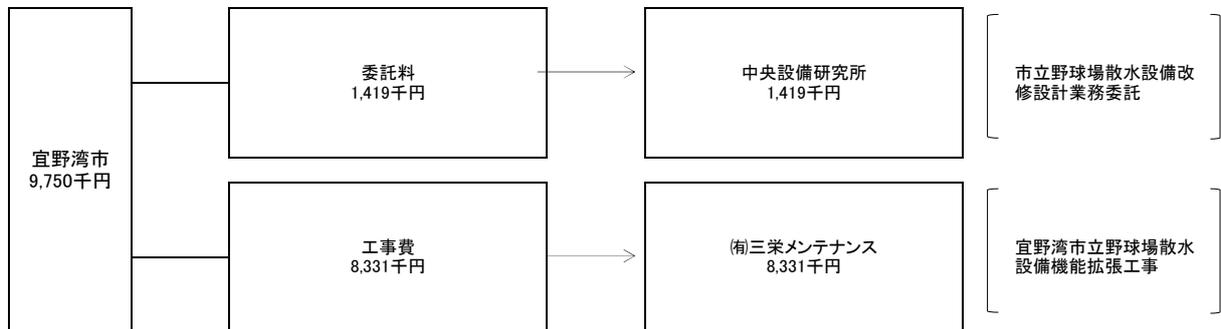

資金の流 れ、費 目・	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	<p>○委託業者及び工事業者は、市指名競争入札参加資格者より選定したうえで、指名競争入札を実施しており妥当である。</p> <p>○予算は実績と見積から積算し、適正な規模と認識している。</p> <p>○費目・用途については積算段階で検査・検収を実施しており事業目的に即して適切であった。</p>
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
