

市町村名		読谷村					
平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-	平和の森球場機能強化事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ウ	
担当部課名	教育委員会 生涯学習課	事業実施(予定)年度	平成24～25年度		沖縄振興基本方針該当箇所	世界水準の観光リゾート地の形成 -1-(1)	
事業内容	良好なトレーニング環境の提供による更なるスポーツコンベンションの誘致と良好なキャンプ見学環境を提供することによる観光客の誘客を図るため、内野の土の入れ替えやスコアボードの電光化等、平和の森球場の全面改修を実施する。						
実施方法	直接実施 委託 補助 負担 その他 ()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		24年度	24年度(繰越)	25年度	26年度	27年度	
	予算の状況	(a)当初予算額	367,777	-			
		(b)予算現額	444,150	-			
		(c)増減額(b-a)	76,373	-			
		(d)繰越額	-	428,558			
		A.計(b+d)	444,150	428,558			
	B.執行済額		15,524	406,671			
	うち交付金充当額		12,420	325,336			
	次年度繰越額		428,558	0			
	執行率(%) (B/A)		3.5%	94.9%			
予算の状況の説明		野球場の財産処分に関する調整手続きに施設の耐用年数等の考え方で沖縄防衛局と村との意見が異なり、その調整に不測の日数を要したため、繰越となった。平成25年9月末にて、当初計画していた事業内容が完了した。					
活動目標(指標)及び達成状況	H24活動目標(指標)		達成状況				
	平和の森球場改修工事設計及び改修工事	目標	(改修工事設計及び改修工事)	()	()	()	
		実績	改修工事設計及び改修工事の完了				
		目標	()	()	()	()	
		実績					
	達成状況説明	平和の森球場改修工事設計及び改修工事を実施した。					
成果目標(指標)及び進捗状況	H24成果目標(指標)		基準値(23年度)	24年度	25年度	26年度	目標値(27年度)
	平和の森球場改修工事設計書の作成	目標	()	設計図書の作成	()	()	()
		実績		設計図書の完成			
	平和の森球場の機能強化	目標	()	機能強化	()	()	()
		実績		機能強化			
	進捗状況説明	平和の森球場改修工事設計及び改修工事を実施したことにより、利用者の利便性の向上が図られたとともに、今後のスポーツコンベンションの誘致に対する対応力が増した。					


取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	機能強化事業を行ったことにより、プロ野球キャンプやその他のスポーツコンベンションへの対応力が増した。	今後、長期的な運用及び維持管理について検討していく必要がある。また、スポーツコンベンション誘致の促進、県内外のスポーツイベント等の開催における施設の利活用を促進させる必要がある。

今後の取り組み方針

プロ野球等のキャンプ誘致活動を行うとともに、各種キャンプ及び各種大会が開催できるよう、施設の維持管理に努める。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費
422,195	422,195	337,756	84,439	0

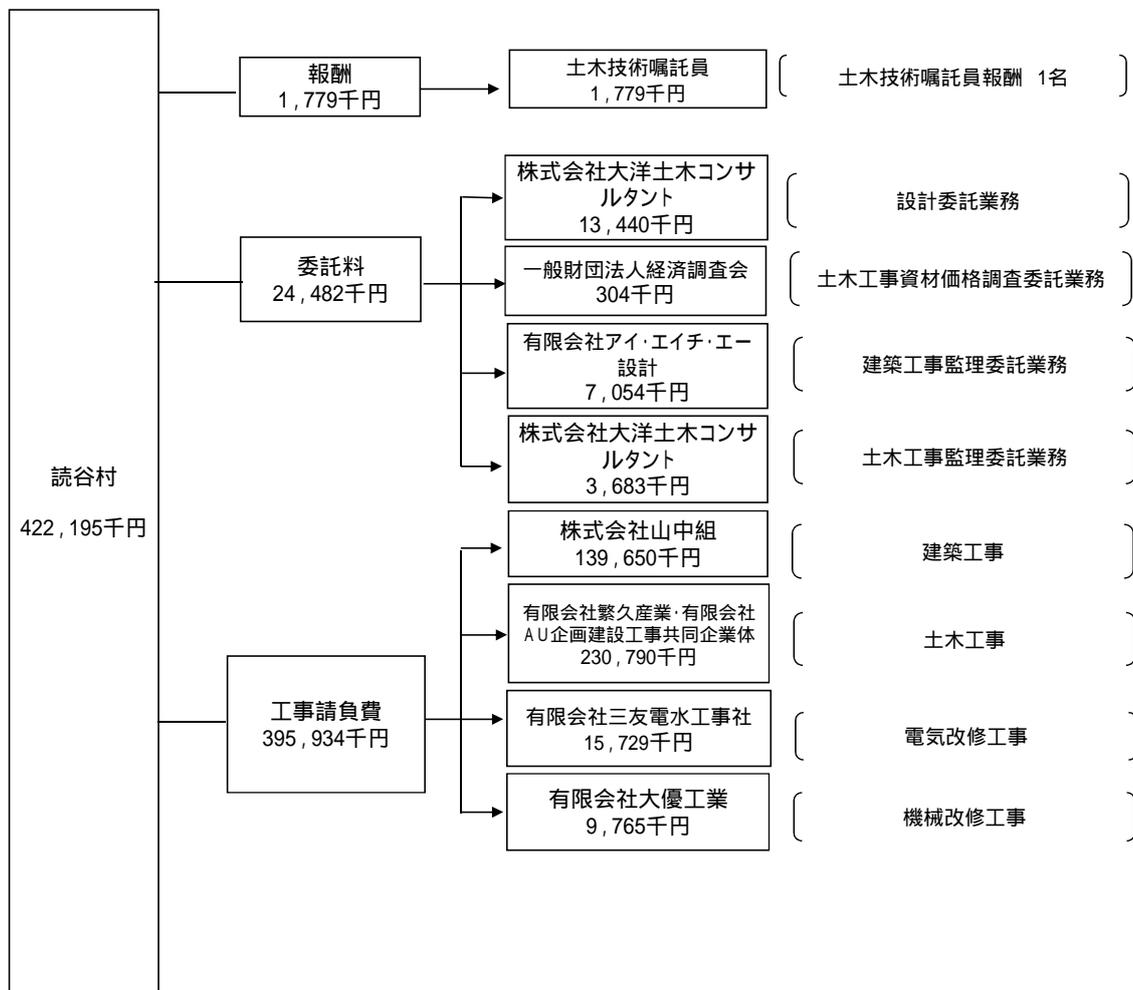

資金の 用途の 流れ、 費目 ・ 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
		支出先の選定方法は妥当か。	○受託業者は指名競争入札を行い、最低落札提示事業者へ発注したので妥当だと考える。また、費目・用途については、事業の目的に鑑み必要な経費のみに支出を行うとともに、額の確定時において支出等に関する書類により確認、適正であった。
		予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
		費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名	読谷村
------	-----

平成24年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号・事業名	1 -	スポーツコンベンション誘致促進事業 (残波岬いこいの広場グラウンド機能強化工事)	沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ウ
担当部課名	建設経済部 商工観光課	事業実施 (予定)年度	平成24～25年度	沖縄振興基本方針 該当箇所
				世界水準の観光リゾート地の形成
				-1-(1)

事業内容	地域振興及び経済活性化に向けて、スポーツコンベンション誘致の促進を図るため、残波岬公園運動広場芝グラウンドの機能を強化する。
------	--

実施方法	直接実施 委託 補助 負担 その他 ()
------	-----------------------

予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+ 「市町村負担」 ベース)	予算の状況	24年度	24年度(繰越)	25年度	26年度	27年度
		(a)当初予算額	253,718	-		
(b)予算現額	179,042	-				
(c)増減額(b-a)	74,676	-				
(d)繰越額	-		103,950			
A.計(b+d)	179,042		103,950			
B.執行済額	74,575		103,950			
うち交付金充当額	59,660		83,160			
次年度繰越額	103,950		0			
執行率(%) (B/A)	41.7%		100.0%			
予算の状況の説明	(a)当初予算額と(b)予算現額の差が 74,676千円発生しているが、当初予算は概算金額で実施設計を行った結果、予定していた工事金額よりも低く抑えることができた。既設構造物の撤去にあたり、慎重な作業が必要となり、不測の日数を要したため、繰越となった。又、当初計画していた事業内容はすべて実施した。					

活動目標 (指標) 及び達成状況	H24活動目標(指標)	達成状況			
		24年度	25年度	26年度	27年度
残波岬いこいの広場グラウンドの工事設計の実施	目標	(1施設)	()	()	()
	実績	1施設			
残波岬いこいの広場グラウンド芝生張替え、防球ネット設置工事の実施	目標	(1施設)	()	()	()
	実績	1施設			
達成状況説明	残波岬いこいの広場グラウンドの実施設計を行った。 残波岬いこいの広場グラウンド機能強化工事を行った。				

成果目標 (指標) 及び進捗状況	H24成果目標(指標)	基準値 (年度)	24年度	25年度	26年度	目標値 (年度)
			残波岬いこいの広場グラウンドの工事設計の作成	目標	()	(1施設)
	実績		1施設			
残波岬いこいの広場グラウンド機能強化	目標	()	(1施設)	()	()	()
	実績		1施設			
進捗状況説明	残波岬いこいの広場グラウンドの実施設計を実施。 残波岬いこいの広場グラウンド機能強化工事を実施。 スポーツキャンプ誘致の促進、県内外のスポーツイベント等の開催におけるグラウンドの利活用が期待できる。					

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	平成24年度は、グラウンドの機能強化整備に要したため、その利活用を図ることができなかった。	スポーツコンベンション誘致の促進、県内外のスポーツイベント等の開催におけるグラウンドや周辺設備等の活用も含め、関係団体と効果的な利活用を促進させる必要がある。
今後の取り組み方針		
残波岬いこいの広場グラウンドを用いて、プロサッカーキャンプおよび各種スポーツキャンプの誘致、各種大会の開催が行えるよう、関係団体と調整しながら、施設の周知、維持管理に努める。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)				
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費
178,525	178,525	142,820	35,705	0
<pre> graph LR A[読谷村 178,525千円] -- 委託料 4,200千円 --> B[株式会社 南土木設計 4,200千円] A -- 工事請負費 173,250千円 --> C["(株)沖秀建設・(有)瀬名波重機建設共同企業体 173,250千円"] A -- 報酬 1,075千円 --> D[土木技術嘱託員報酬 1名] B --- E["残波岬いこいの広場グラウンド機能強化 工事実施設計にかかる委託業務"] C --- F["残波岬いこいの広場グラウンド機能強化 工事にかかる工事請負費"] D --- G["土木技術嘱託員報酬 1名"] </pre>				

資金の用途の点検・費目	評価	点検項目	評価に関する説明
		支出先の選定方法は妥当か。	受注業者は指名入札方式により、企業組織、実績、知識等を勘案した上で選定しており、妥当であり、予算規模、費目・用途についても適正であった考える。
		予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
		受益者との負担関係は妥当であるか。	
		費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
