

市町村名	渡嘉敷村
------	------

**平成24年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】**

事業番号・事業名	1 - 渡嘉敷港ターミナル機能強化事業	沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(11)-ウ
担当部課名	経済建設課	事業実施(予定)年度	平成24～25年度
		沖縄振興基本方針該当箇所	離島における定住条件の整備 -1-(1)

**事業内容**  
 渡嘉敷港ターミナル利用者の利便性向上を図るため、ターミナルの吹き抜けとなっている通路及び旧ターミナへの連絡通路や旅客出入り口に屋根を設置する。また、ターミナル内のトイレを和式タイプから洋式タイプに取り替え、更に老朽化により使用出来なくなっている空調設備の取替工事を行う。


**実施方法**  
 直接実施      委託      補助      負担      その他 ( )

予算額・執行額 【単位:千円】 （「交付金」+「市町村負担」ベース）	予算の状況	24年度	24年度(繰越)	25年度	26年度	27年度
		(a)当初予算額	61,554			
(b)予算現額	61,554					
(c)増減額(b-a)	0		0			
(d)繰越額	-		29,695			
A.計(b+d)	61,554		29,695			
B.執行済額	31,859		29,211			
うち交付金充当額	25,487		23,368			
次年度繰越額	29,695		0			
執行率(%) (B/A)	51.8%		98.4%			
予算の状況の説明	・港ターミナルの構造計算の確認・検証を行ったところ、設計変更の必要があり、その調整に不測の日数を要したことにより、屋根設置工事及び当該工事の施工管理業務に係る29,695千円を次年度に繰り越した。 ・不用額が484千円発生しているが、入札残によるものである。					

活動目標(指標)及び達成状況	H24活動目標(指標)	達成状況			
		24年度	25年度	26年度	27年度
トイレ改修工事、空調機取替工事、屋根改修工事設計・工事及び施工管理	目標	トイレ改修・空調機取替・屋根改修の各工事等の実施	( )	( )	( )
	実績	トイレ改修・空調機取替・屋根改修の各工事等の実施完了			
	目標	( )	( )	( )	( )
	実績				
達成状況説明	トイレ・空調機の改修及び屋根設置工事に係る設計等は年度内に執行できたが、屋根設置工事及び施工管理業務については、平成25年度に繰り越して事業を実施し、平成25年8月までに全事業が完了した。				

成果目標(指標)及び進捗状況	H24成果目標(指標)	基準値(年度)	24年度	25年度	26年度	目標値(年度)
			目標	トイレ改修・空調機取替・屋根改修の各工事等の実施	( )	( )
	実績	トイレ改修・空調機取替・屋根改修の各工事等の実施完了				
[参考指標]	目標	( )	( )	( )	( )	
	実績					
進捗状況説明	平成25年度に繰り越した事業も全て完了し、港ターミナル利用者の利便性の向上が図られた。今後も港ターミナルの機能強化を図っていく。					

取組の検証	推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)
	トイレの取替・空調機の取替及び屋根設置により、港ターミナル利用者の利便性の向上が図られたが、屋根については、可動式テント屋根ということで、耐久性等を考慮した適正な維持管理を行って行く必要がある。	日常点検等による適正な維持管理を行っていく必要がある。
<b>今後の取り組み方針</b>		
適正な維持管理を行っていくとともに、港ターミナルの更なる利便性の向上と機能強化を図っていく。		

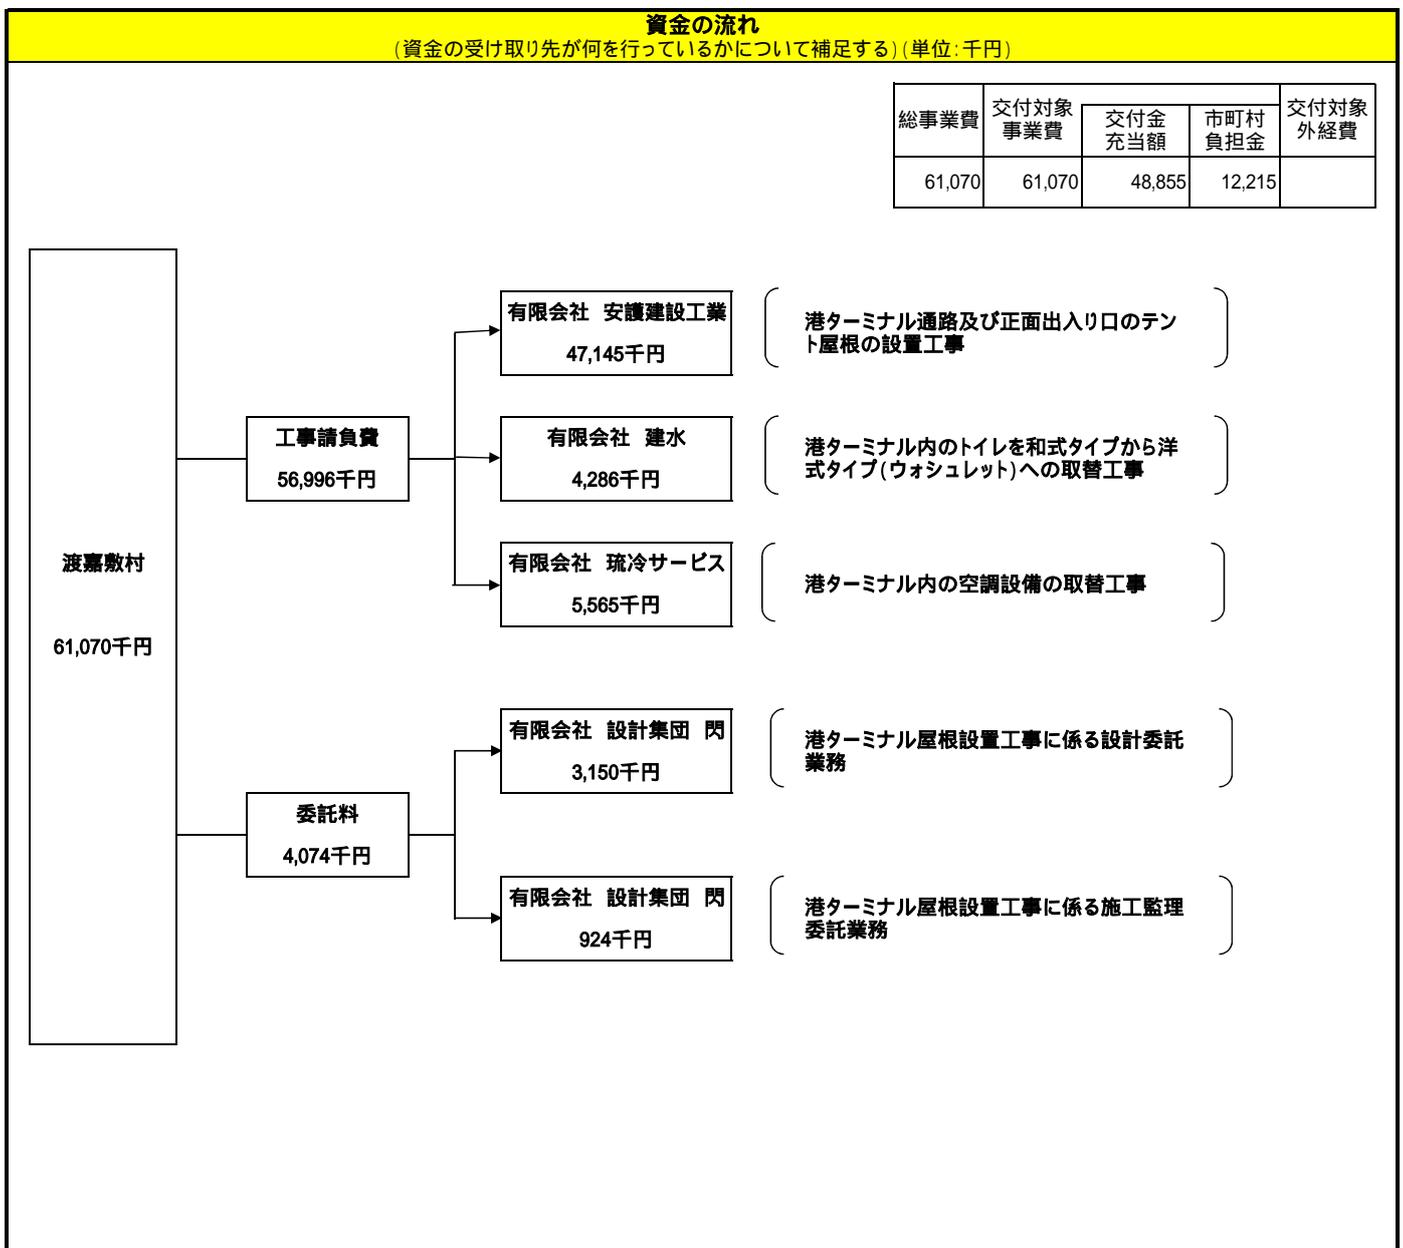

資金の流 点検 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
		支出先の選定方法は妥当か。	委託事業者は三者見積もり及び指名競争入札により選定し、工事請負業者についても指名競争入札により業者決定しており妥当であったと考えている。 費目用途については、支出等に関する書類により確認し、適正であった。
		予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
		費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
